



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 32/2021/SEGOV

Mariana, 23 de fevereiro de 2021.


A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Assunto: Requerimento nº 20/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao requerimento em epígrafe encaminho a Vossa Excelência a CI nº 114/2021 da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo

Câmara Municipal de Mariana
Protocolado sob nº 84
Em 23/02/21 16:39
Patricia Gomes



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

CI - Comunicação Interna

Nº
114

Data:
23/02/2021

De: Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Secretaria de Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 20/2021

Resposta aos questionamentos do Requerimento 20/2021:

- Considerando que a UBS Rosário se trata de uma obra, um projeto pronto, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) captada em 2014 junto ao Governo de Estado de Minas Gerais através de Resolução propostas pelo próprio Estado, e considerando que infelizmente, nenhuma foi cumprida, quais foram as justificativas apresentadas ao Município para a não realização dos repasses financeiros e consequentemente, a paralização da Obra?

O Governo de Estado de Minas Gerais parou de fazer o repasse ao Município de Mariana e não houve justificativa da mesma para o não repasse.

- Qual o valor repassado pelo Estado ao Município de Mariana?

O Governo do Estado de Minas Gerais repassou ao Município de Mariana a parcela de R\$ 209.444,19.

- Quanto aos demais questionamentos, informamos que a Secretaria de Saúde era a ordenadora de despesa deste contrato.

André Lima Belico
Secretário Municipal de Obras Gestão Urbana

Local de entrega:

Assinatura: _____

Recebido em/...../2021

Nome completo
Carimbo: _____

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE METAS -REFORMA OU OBRA

CONCEDENTE: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE MARIANA

Nº DO CONVÊNIO: RESOLUÇÃO
SES/MG Nº 4149 DE 04 DE FEVEREIRO
DE 2014

Nº DO ÚLTIMO TERMO ADITIVO:

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 986.600,00

Nº de Parcelas
Recebidas: 01
Parcela Única Parcelado
PARCELA DE R\$
209.444,19

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - UBS TIA NO BAIRRO ROSÁRIO, MARIANA, MG

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Período de Acompanhamento: 01/07/2015 A 15/07/2016

Endereço da Reforma ou Obra: RUA PERIMETRAL SUCUPIRA, BAIRRO ROSÁRIO, MARIANA, MG	Latitude: 20°21'56.46" S	Longitude: 43°25'43.89" O	Área Total da Reforma ou Obra: 400,93 M², O EQUIVALENTE AO FECHAMENTO DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO
--	-----------------------------	------------------------------	---

Forma e Regime de Execução da Obra: INDIRETA

☒ Direta ☐ Indireta

Valor Contratado com eventuais
Termos Aditivos: R\$ 1.359.559,17

Empresa Contratada: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA

Data da Ordem de Serviço: 27/03/2015

Prazo de Execução: 600 dias

Data de conclusão prevista inicialmente: 26/11/2015

SITUAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

SITUAÇÃO DA REFORMA OU OBRA:

Data da Visita: 21/09/2018

Tendência de Conclusão da Reforma ou Obra: Clique aqui para
inserir uma data. OBRA PARALISADA DESDE 16/07/2016

Percentual Executado: 39,38%

☒ Concluída ☐ Em andamento ☐ Paralisada ☐ Não iniciada ☐ Concluída
Se o percentual de execução estiver inferior ao previsto no Plano de Trabalho, apontar o motivo: OBRA
PARALISADA DESDE 16/07/2016

ACOMPANHAMENTO

ESPECIFICAÇÃO DA META 1: INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE	ACOMPANHAMENTO 1º SEMESTRE		ACOMPANHAMENTO 2º SEMESTRE	
	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO
SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E INFRAESTRUTURA	100	100		

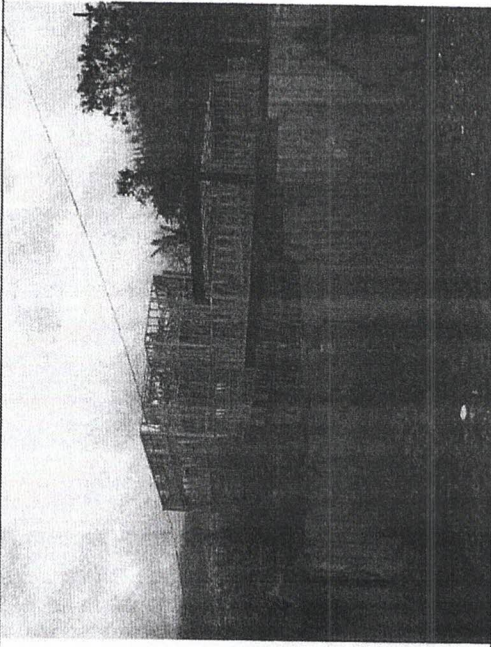
ESPECIFICAÇÃO DA META 2: SUPERESTRUTURA

DESCRIÇÃO DA ETAPA, FASE OU ATIVIDADE	ACOMPANHAMENTO 1º SEMESTRE		ACOMPANHAMENTO 2º SEMESTRE	
	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO	% PREVISTO ACUMULADO	% REALIZADO ACUMULADO
ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING	50	50	100	75

OBSERVAÇÕES: OBRA PARALISADA APÓS O SEGUNDO SEMESTRE

FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA REFORMA OU OBRA

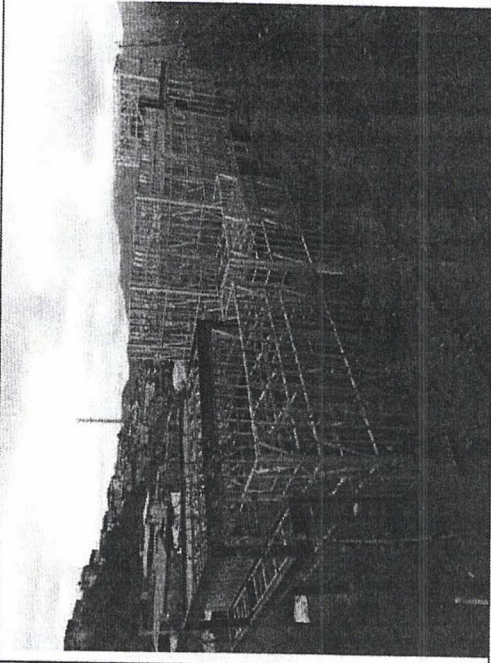
FOTO 01



Descrição: REGISTRO REALIZADO EM 21/09/2018 (LOCAL PROTEGIDO POR TAPUMES)

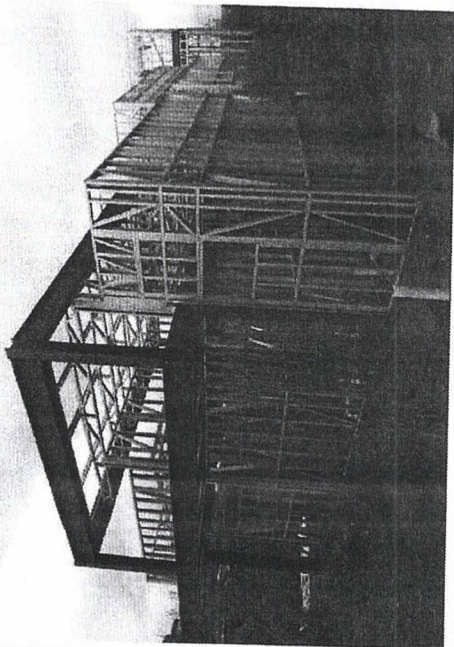
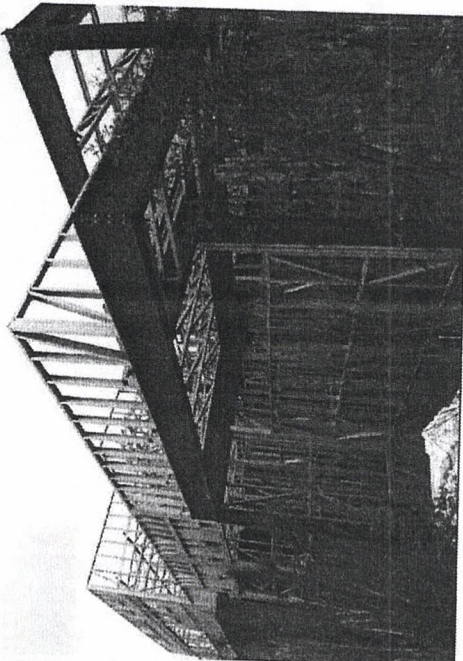
FOTO 03

FOTO 02



Descrição: REGISTRO REALIZADO EM 21/09/2018 (VISÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO)

FOTO 04

	
Descrição: REGISTRO REALIZADO EM 21/09/2018 (VISÃO DO EMPREENDIMENTO)	Descrição: REGISTRO REALIZADO EM 21/09/2018 (VISÃO DO EMPREENDIMENTO)
ASSINATURAS	
Assinatura do Responsável Técnico do Conveniente	21 / 09 / 2018 Data
Carimbo de Identificação com CREA ou CAU	Carimbo de Identificação
	Assinatura do responsável legal do Conveniente
	_____/_____/_____ Data
